









	DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER (DESC)	Fermeture de la RD60a Bouc Bel Air
---	--	---

MAITRE D'OUVRAGE :	Canal de Provence : APMP : SEMM :   
MAITRE D'ŒUVRE :	Canal de Provence : APMP : SEMM :   
GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental 13 : Cabriès : Bouc Bel Air :   
ENTREPRISE :	SADE : 



VERSION 1

En date du 26/09/2022

	NOM	DATE	VISA
Rédigé par	M JUVANON Wilfrid	26/09/2022	
Approuvé par	M.GIORDANA Florent		
	M. ou Mme le Maitre d'œuvre		



I. Table des matières	
II. PRESENTATION DU PROJET	3
1. Description	3
2. Objectif du dossier	4
II. INTERVENANTS	5
1. Maitre d'ouvrage.....	5
3. Maitre d'œuvre	5
4. Gestionnaire de voirie	6
5. Entreprises.....	7
6. Coordinateur SPS.....	7
III. PRESCRIPTIONS GENERALES	8
IV. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	9
1. Mise en place et récolement de la signalisation sur chantier.....	9
2. Astreinte et maintenance.....	9
V. ORGANISMES CONSULTES	9
VI. Phase 1 : Principe de fermeture	10
.....	10
VII. Phase 1.1 : balisage carrefour Marcel Pagnol RD60c / RD60a	11
1. Principe de fermeture	11
2. Déviation	12
VIII. Phase 2 : Principe de fermeture	13
IX. Déviation	14



II. PRESENTATION DU PROJET

1. Description


Il s'agit de réaliser des travaux sur les réseaux d'eau situé sur la RD60 dans la commune de Cabriès.

La RD60 devra être fermée à la circulation sauf aux riverains.

La signalisation sera faite sous 2 phases :

- Phase 1 : de l'Avenue Marcel Pagnol (exclue) au croisement rue de la Reynardière (inclus)
- Phase 2 : De la rue de la Reynardière jusqu'au giratoire de la RD60a/RD8n


Zone de chantier :

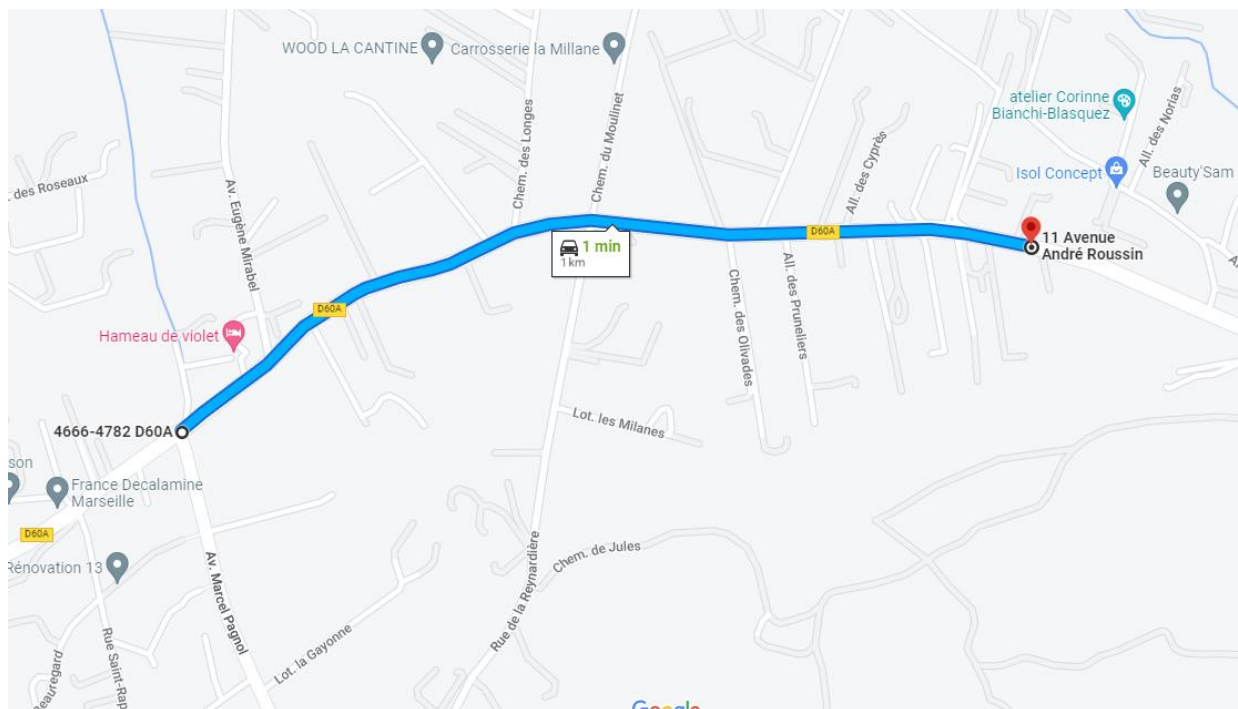



DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER (DESC)

Fermeture de la
RD60a
Bouc Bel Air

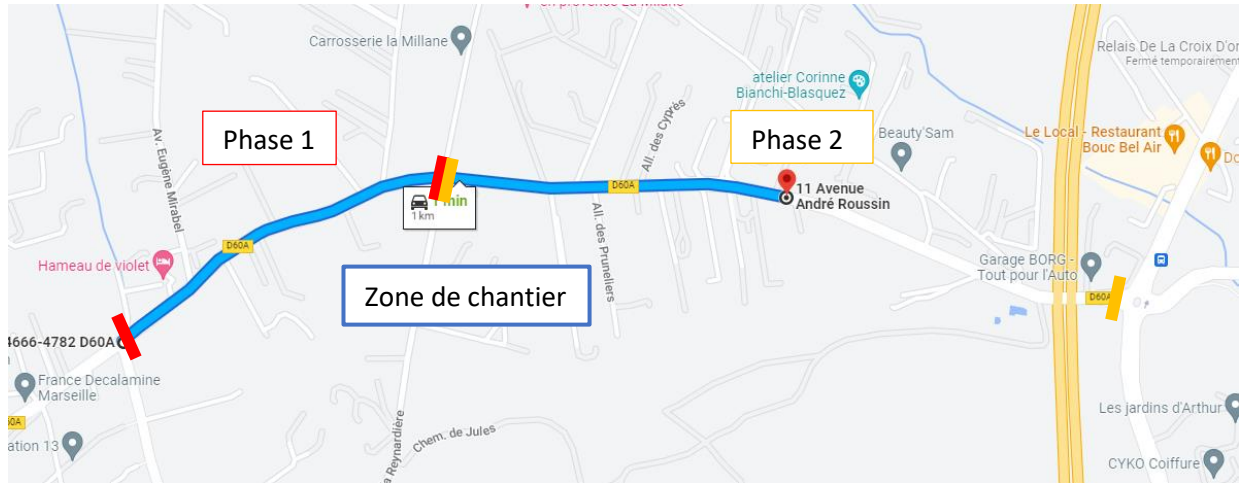


2. Objectif du dossier

Ce dossier d'exploitation sous chantier traite de la signalisation mise en place durant toute la réalisation des travaux

Ce DESC a donc pour objectif :

- De proposer les principes de fermeture
- De proposer des itinéraires de déviation.
- De garantir la sécurité des usagers et des entreprises présentes sur le chantier.

	DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER (DESC)	Fermeture de la RD60a Bouc Bel Air
---	--	---

II. INTERVENANTS

1. Maitre d'ouvrage

Canal de Provence

Adresse : 3099 Route Cézanne
13100 LE THOLONET
Tél : 04 42 66 70 00

Contact : HOWES, Barbara <Barbara.HOWES@canal-de-provence.com>

Aix Marseille Métropole

Adresse :

Contact : DUFFAU Julien julien.duffau@ampmetropole.fr

Eaux de Marseille

Adresse :


Contact : ALIANE Rachid Rachid.ALIANE@eauxdemarseille.fr

3. Maitre d'œuvre

Canal de Provence

Adresse : 3099 Route Cézanne
13100 LE THOLONET
Tél : 04 42 66 70 00

Contact : HOWES, Barbara <Barbara.HOWES@canal-de-provence.com>

	DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER (DESC)	Fermeture de la RD60a Bouc Bel Air
---	--	---

Aix Marseille Métropole

Adresse :

Contact : DUFFAU Julien julien.duffau@ampmetropole.fr

Eaux de Marseille

Adresse :

Contact : ALIANE Rachid Rachid.ALIANE@eauxdemarseille.fr

4. Gestionnaire de voirie

Conseil Départemental 13

Arrondissement d'Aix en Pce

Secteur de Vitrolles

Contact : José Silva jose.silva@departement13.fr

Ville de Cabriès

Adresse : Pl. Ange Estève, 13480 Cabriès

Ville de Bouc Bel Air

Adresse : Rue de l'Hôtel de ville, 13320 Bouc-Bel-Air



**DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER
(DESC)**

**Fermeture de la
RD60a
Bouc Bel Air**

5. Entreprises

- **SADE**

251 Bd Mireille Lauze – 3010 Marseille

Conducteur de travaux :

M. GIORDANA Florent

Mail : giordana.florent@sade-cgth.fr

- **TECHNISIGN**

629 Avenue Denis Papin BP 50021

13655 Rognac Cedex

Tel : 09.54.48.26.93/Fax : 09.59.48.26.93

Chargée d'affaires :

M JUVANON Wilfrid

Mail : w.juwanon@technisign.net

6. Coordinateur SPS

N.D.

III. PRESCRIPTIONS GENERALES

Zone de stockage : terrain chez un particulier (en cours de validation avec le particulier)



Les panneaux utilisés seront en bon état, de dimensions et de caractères réglementaires, de classe 2.

Ils seront posés :

- Sur trépied lesté avec des sacs de sable.
- Sur support métallique lesté par des pieds en caoutchouc.
- Sur support existant fixé au feuillard.


Les personnes à joindre en cas d'accident éventuel ou de détérioration de la signalisation sont :

**La personne à contacter en cas d'urgence
pour le balisage :**

24h/24 et 7j/7 est

M Teddy MARTINEZ (Chef de Chantier)

Au 06 71 43 56 42

	<p align="center">DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER (DESC)</p>	<p align="center">Fermeture de la RD60a Bouc Bel Air</p>
---	--	---

IV. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1. Mise en place et récolement de la signalisation sur chantier

Les travaux de travaux s'effectueront sur 5 mois. La fermeture sera présente de jour comme de nuit 7j/7 24h/24

Les travaux seront réalisés dans la période du 24/10/2022 au 24/03/2023

Nota : Les dates et les délais indiqués sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement du chantier, des intempéries ou avaries éventuelles.

Le récolement de la signalisation sera effectué par le gestionnaire en présence de l'entreprise et du maître d'œuvre lors de chaque modification de la signalisation.

2. Astreinte et maintenance


Une maintenance du balisage sera réalisée par l'entreprise TECHNISIGN durant toute la durée de la fermeture.

La chaussée sera restituée propre par l'entreprise SADE.

V. ORGANISMES CONSULTES

- Conseil Département 13
- Ville de Cabriès
- Ville de Bouc Bel Air
- Transport en commun
- Force de l'ordre (PM et PN)
- Services de secours (incendie, secours aux victimes)


VI. Phase 1 : Principe de fermeture

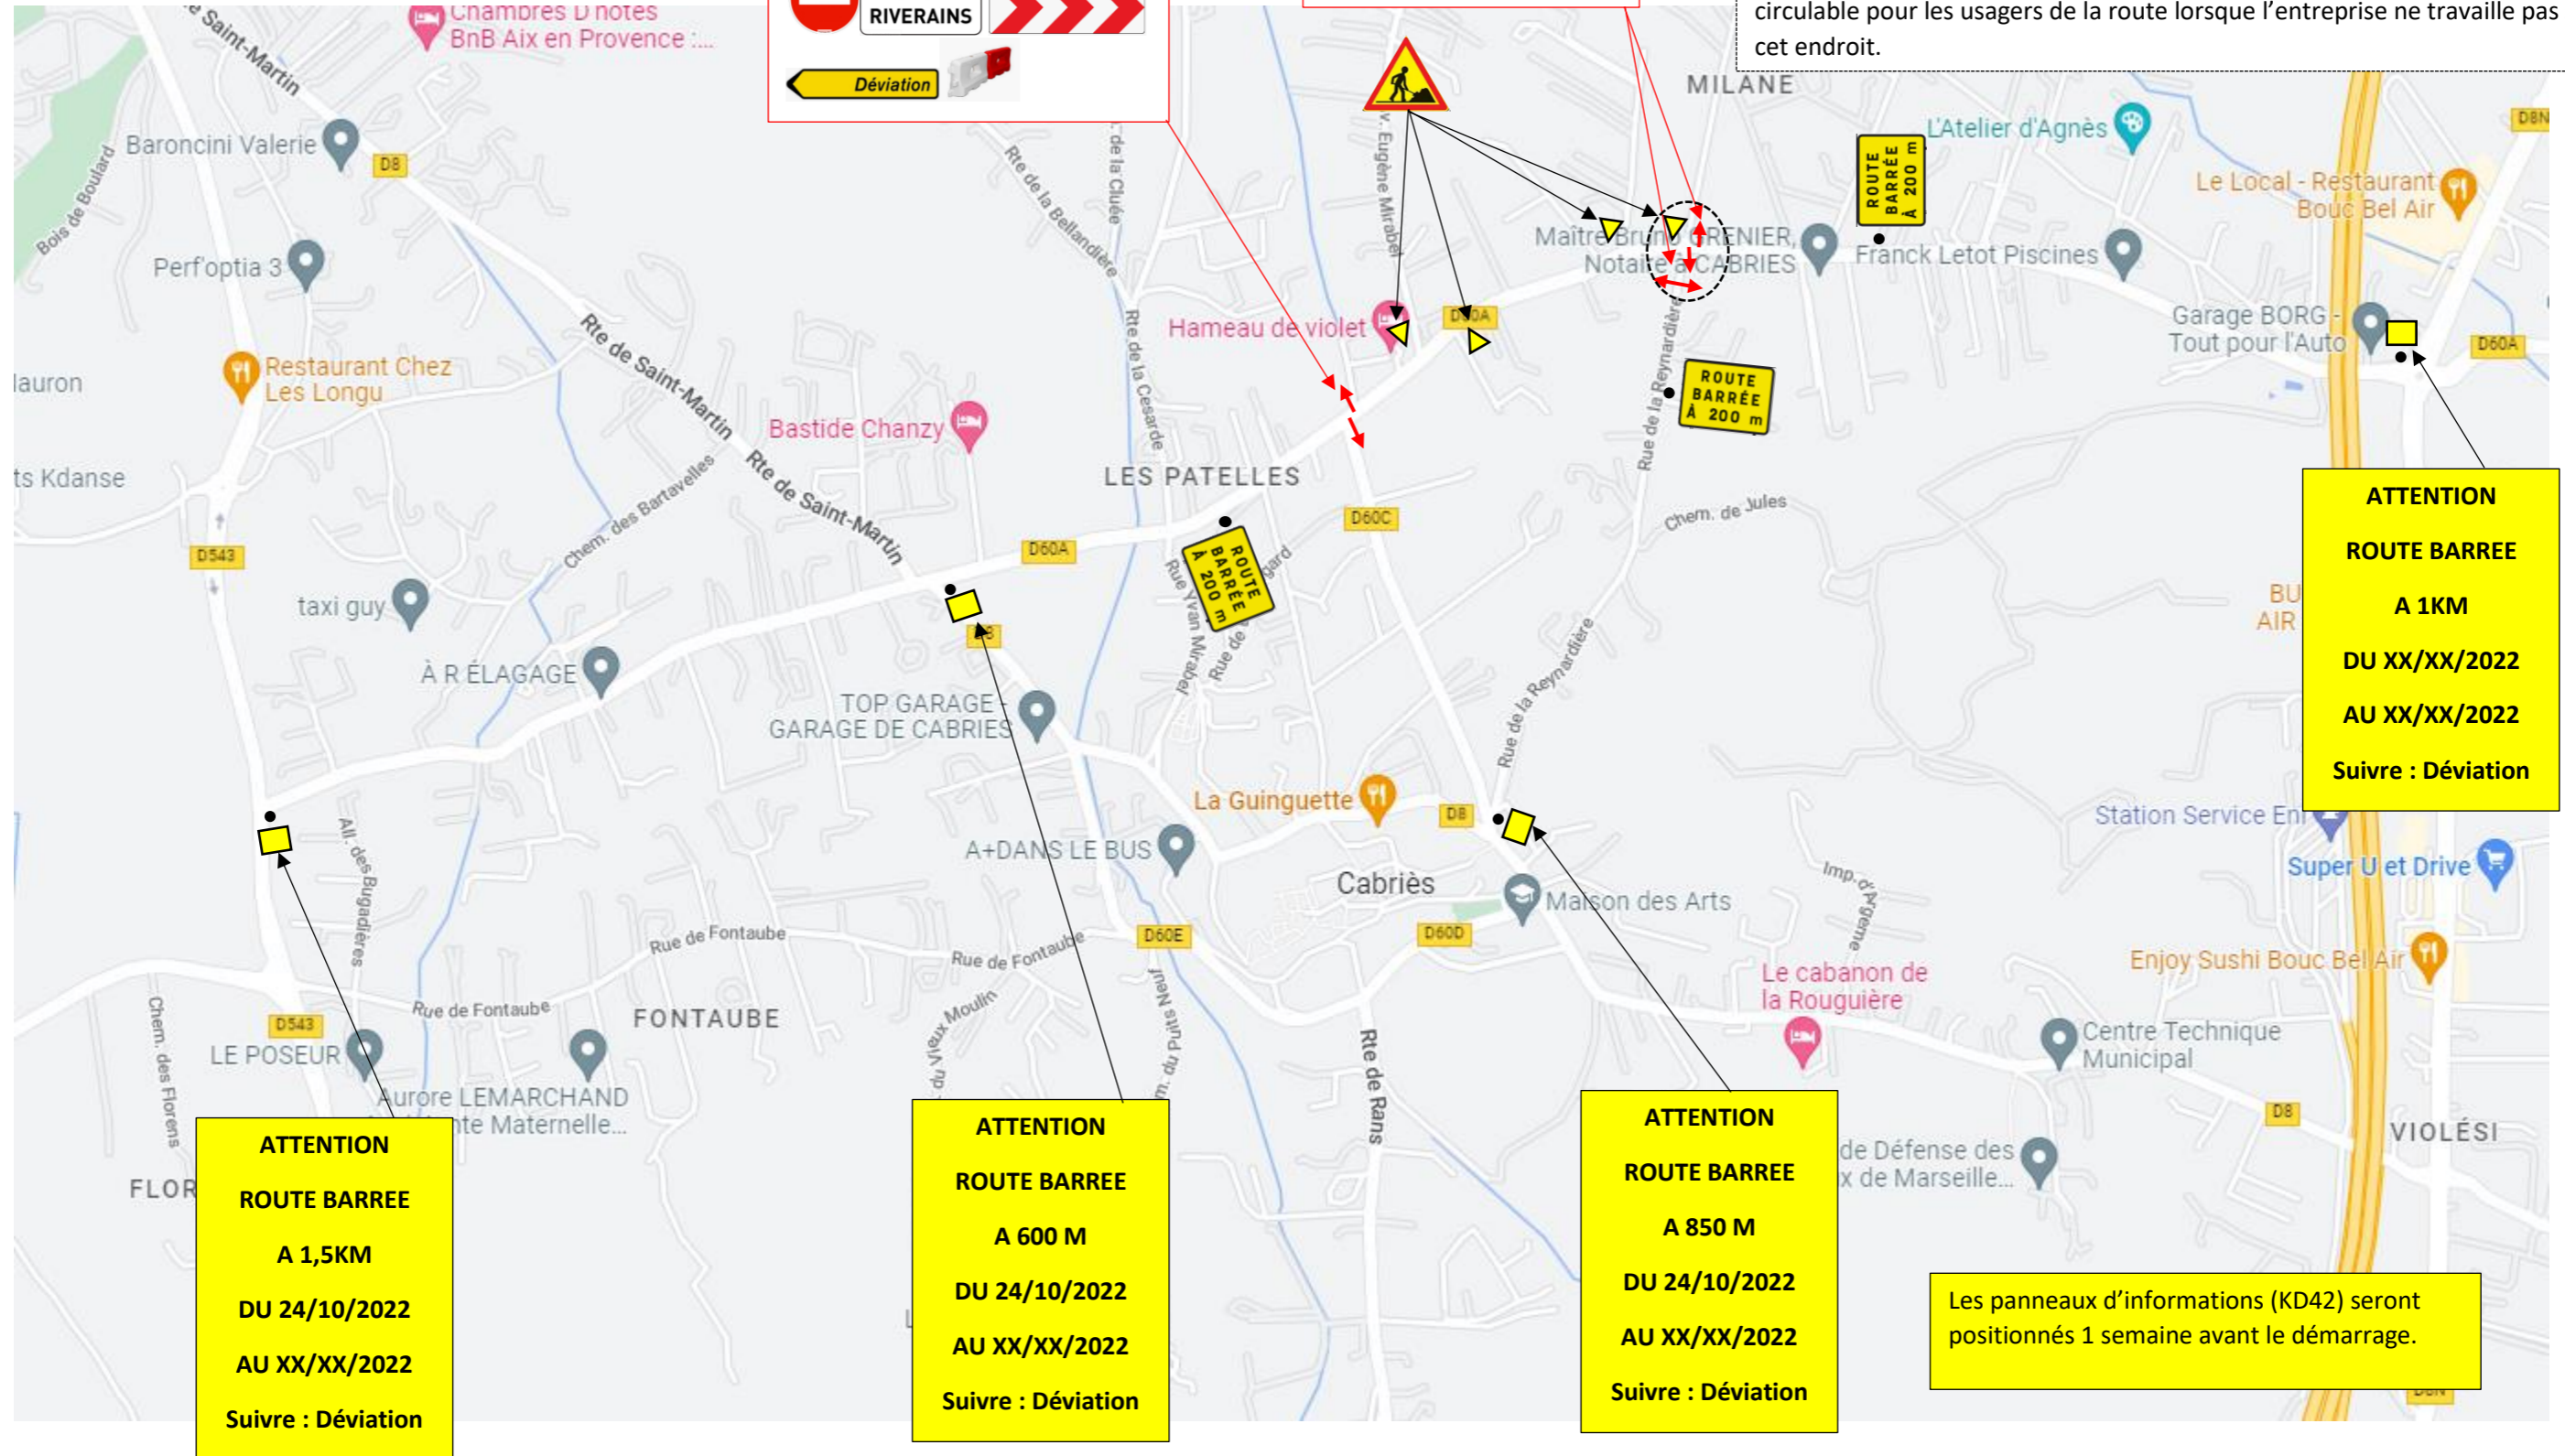


VII. Phase 1.1 : balisage carrefour Marcel Pagnol RD60c / RD60a

1. Principe de fermeture

Durant 1 semaine avant la phase 1 puis 1 semaine à la fin de la même phase, nous devons fermer le carrefour afin que la SADE puisse effectuer la pose ainsi que le maillage.

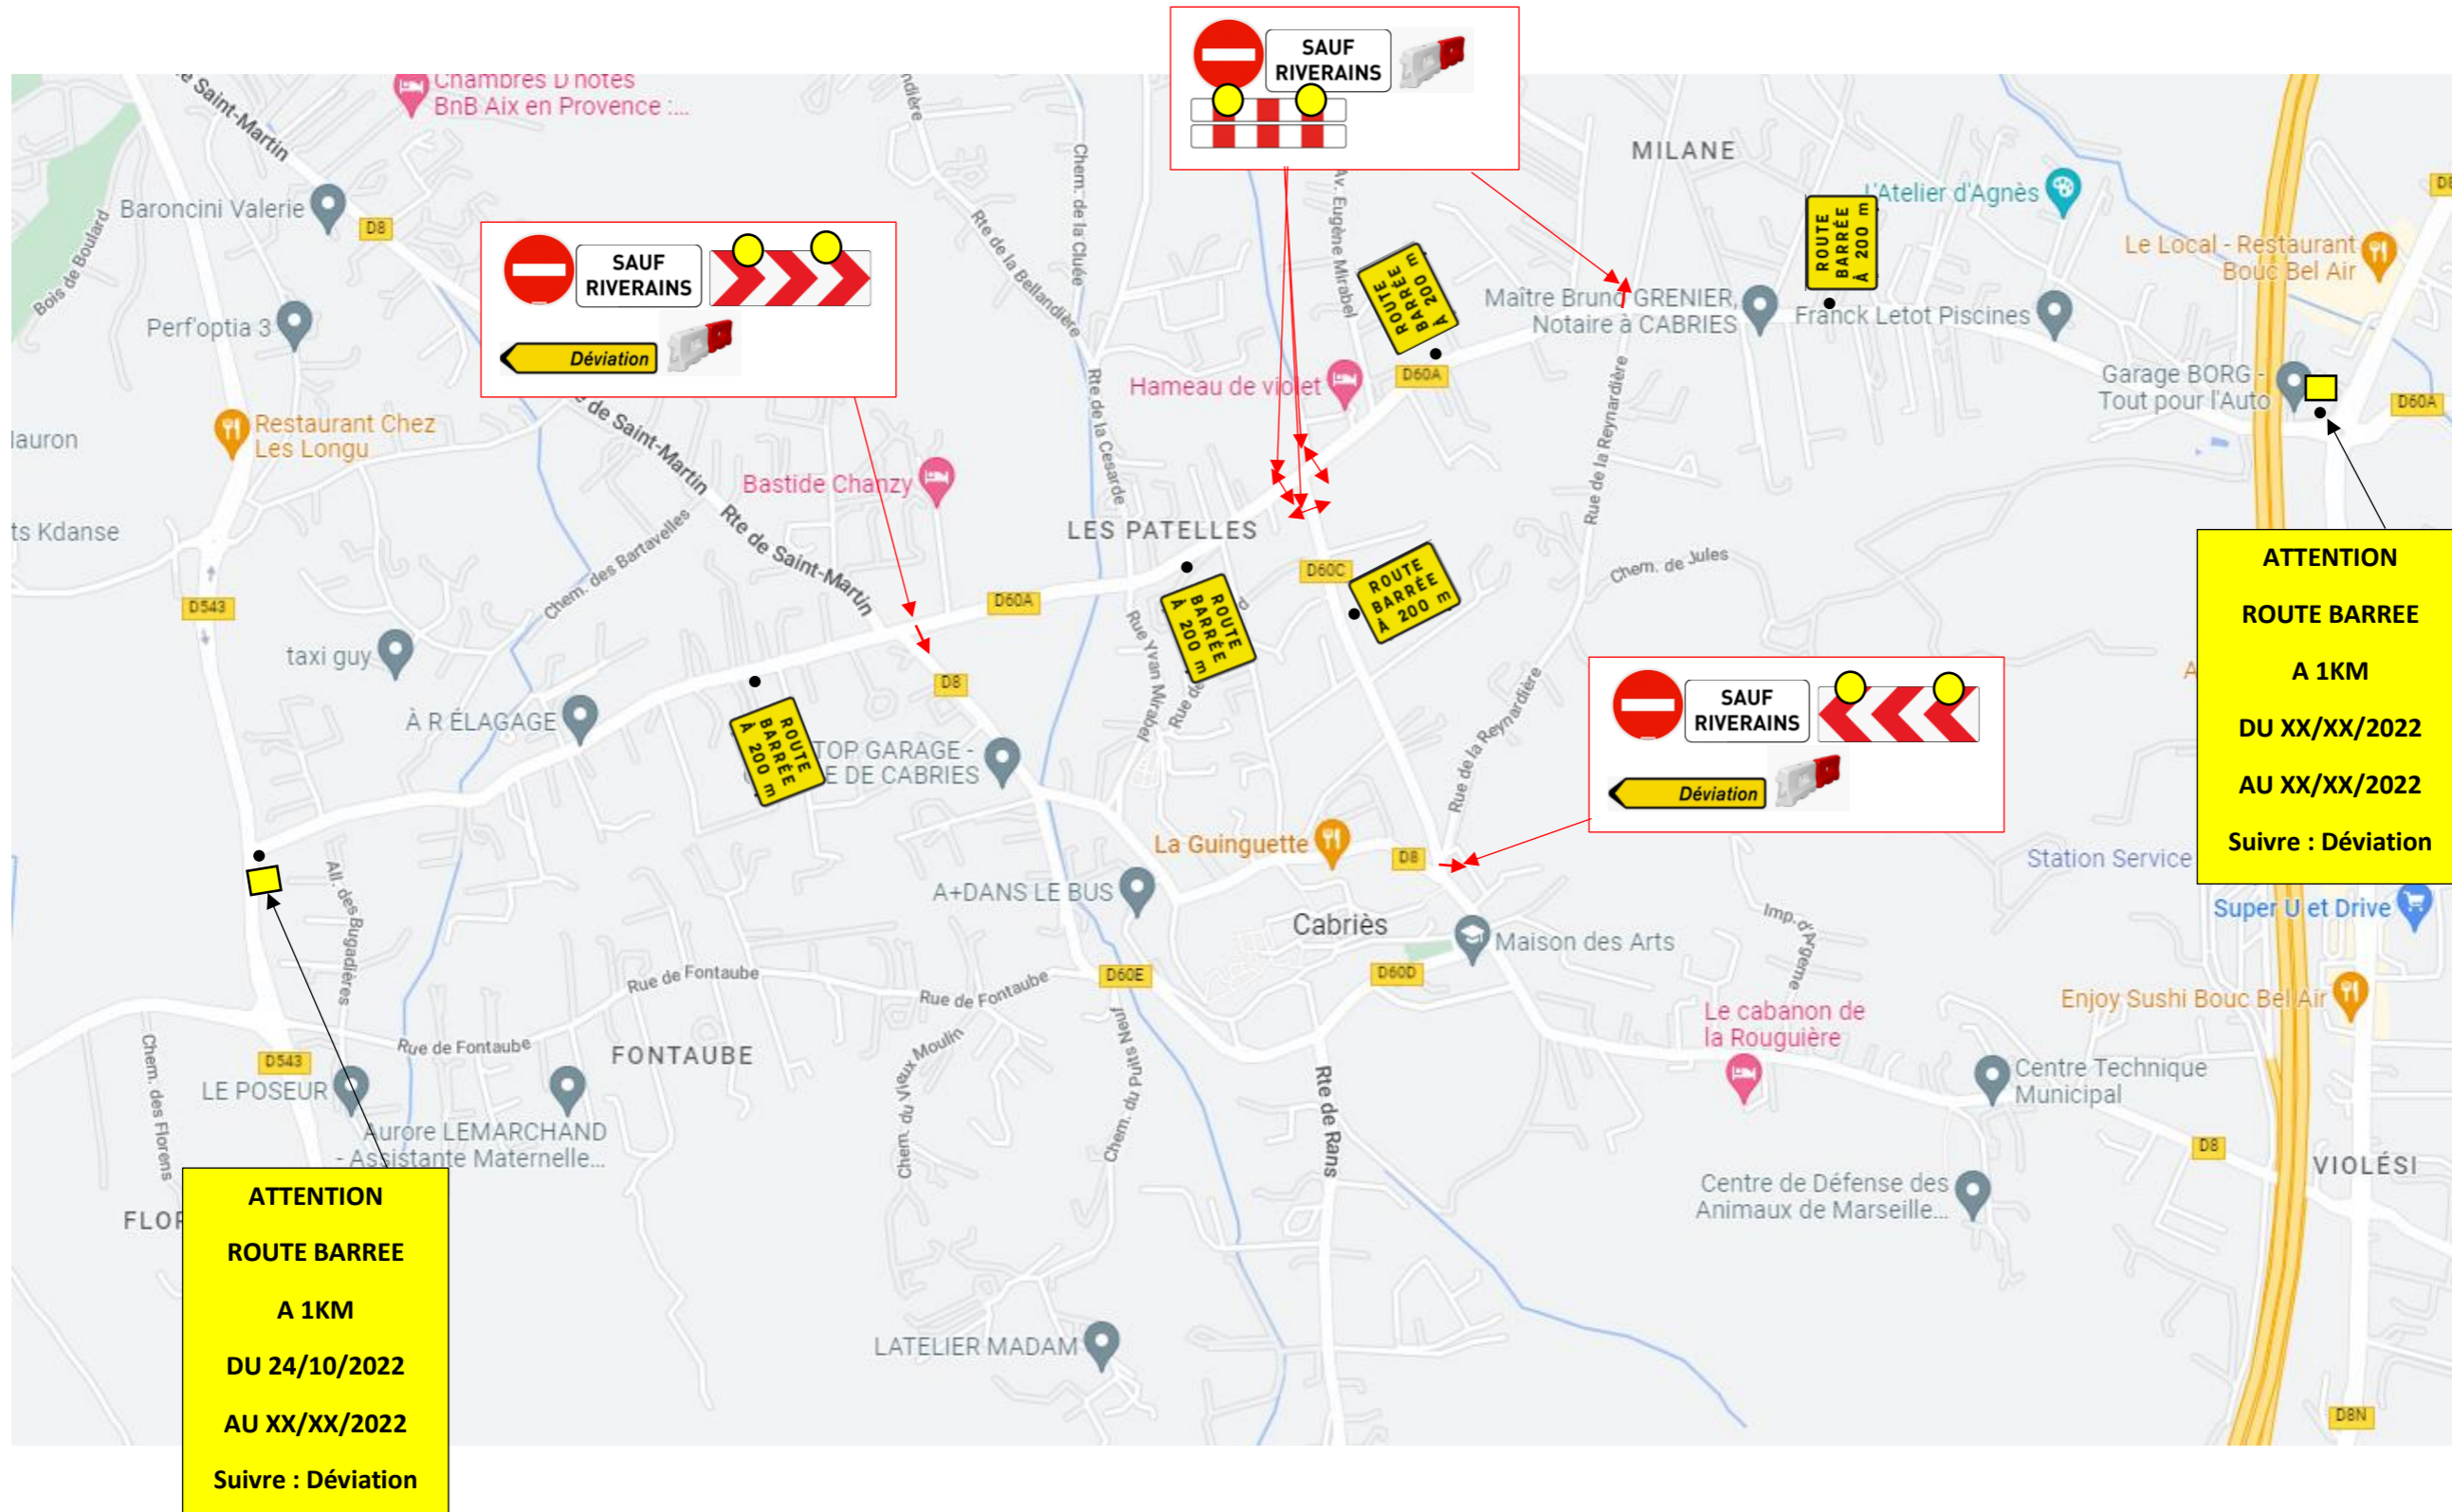

VIII. Phase 2 : Principe de fermeture

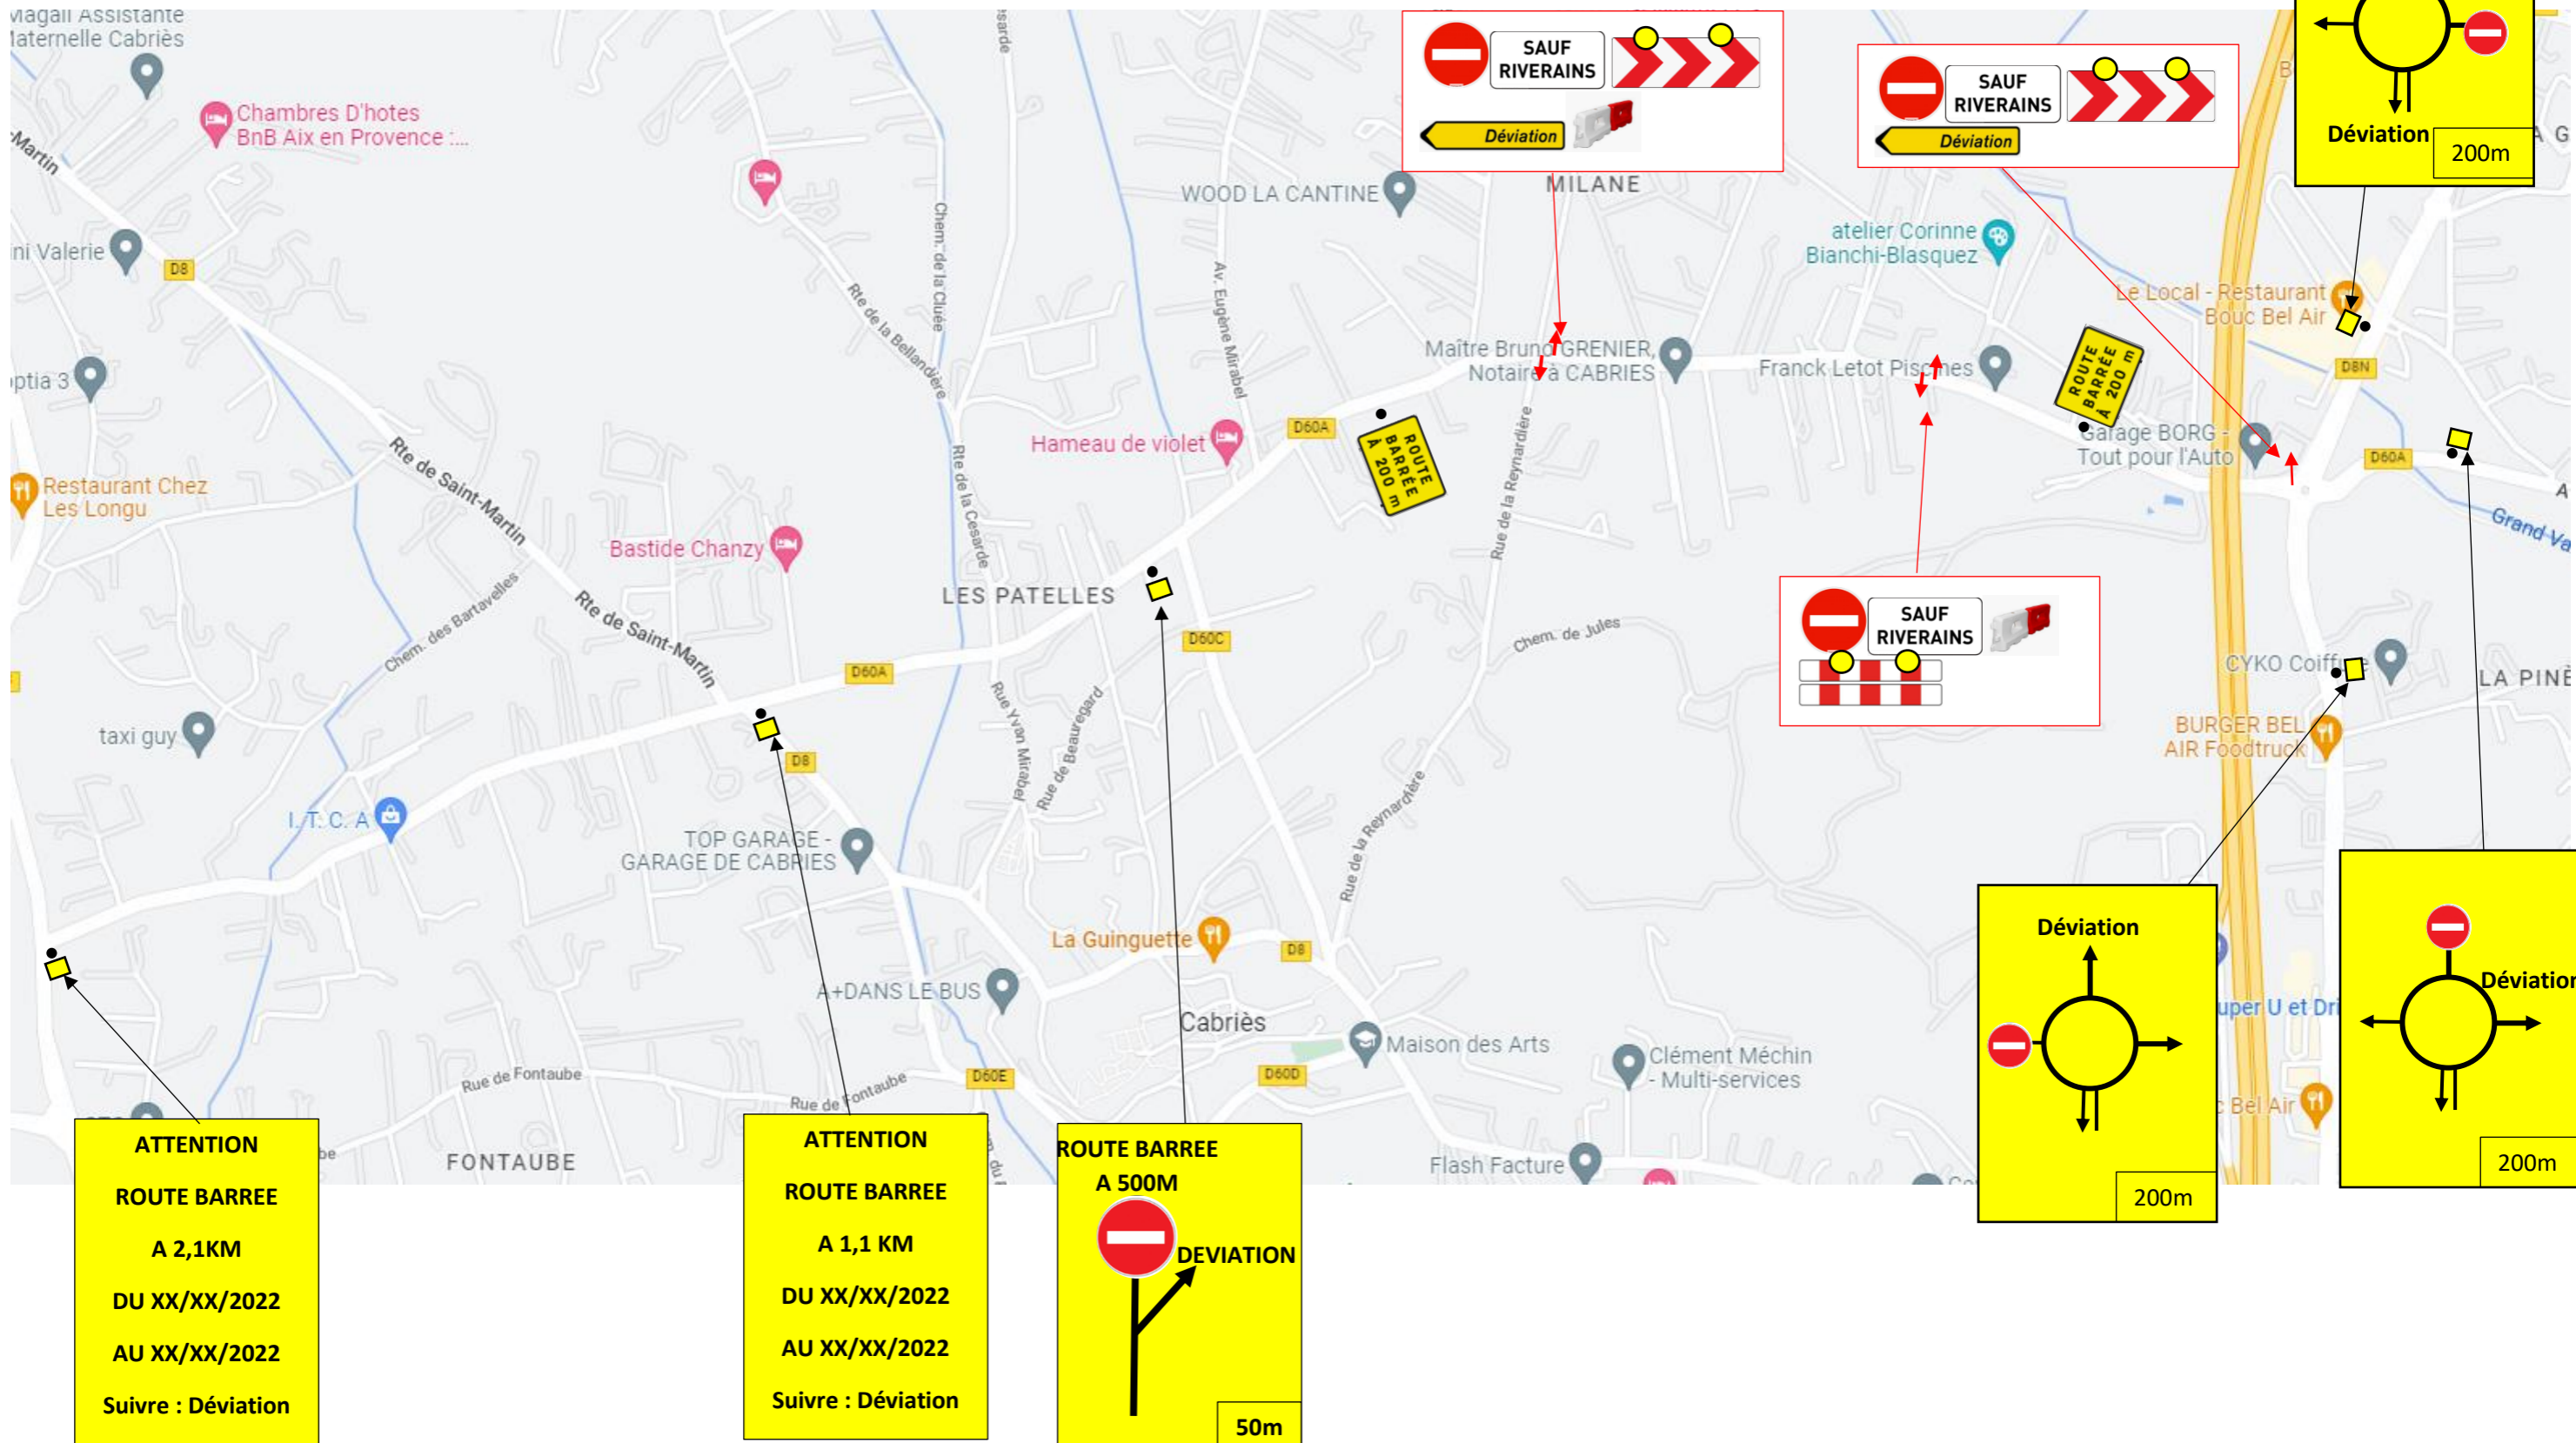

IX. Déviation

La déviation sera identique pour les 2 phases de chantier.

